
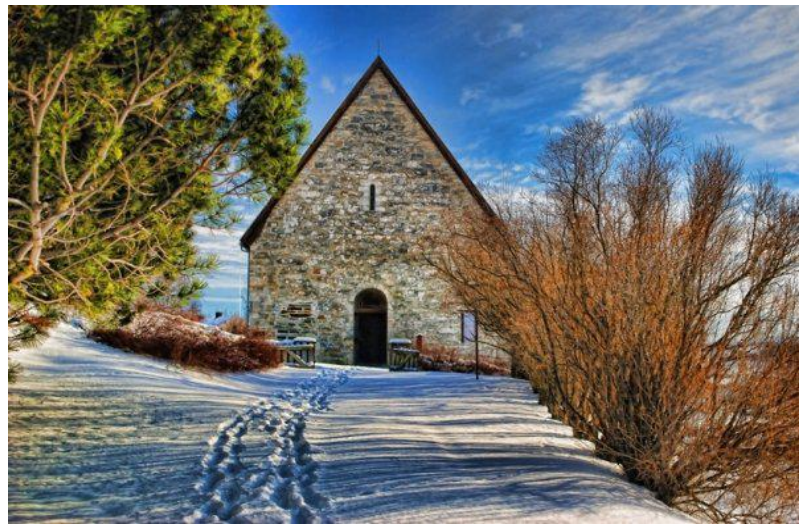


Sluttrapport 2013-2016

«Inderøy – best i lag»

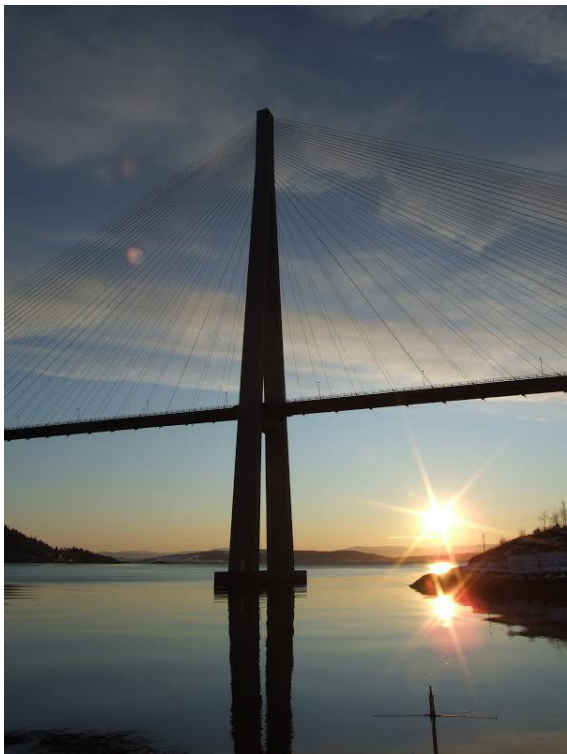

Sluttrappport Bolystprosjektet

«Inderøy – best i lag» 2013 - 2016

Innholdsfortegnelse

MÅL OG RAMMER

Bakgrunn, forankring	3
Mål	4
Resultat overordnede mål	5
Målgrupper	7
Resultat målgrupper	7
Rammer	9
Videreføring og overføringsverdi	10
Gjennomføring: Overordnet prosjekt	11
Delprosjekt I	12
Beskrivelse av tiltak, resultat og videreføring	
Delprosjekt II	14
Beskrivelse av tiltak, resultat og videreføring	
Delprosjekt III	22
Beskrivelse av tiltak, resultat og videreføring	
Erfaringer fra prosjektet	34
Økonomi	35

MÅL OG RAMMER

Bakgrunn

Frivillig Inderøy ble invitert inn i Inderøy Kommunes samfunnsutviklingsprosjekt "Inderøy 2020" i 2013. Samfunnsutviklingsprosjektet viste at de to sammenslåtte kommunene; Inderøy og Mosvik, begge slet med stagnasjon eller nedgang i befolkningsveksten.

Samfunnsutviklingsprosjektet "Inderøy 2020" hadde flere delprosjekt, men ingen delprosjekt direkte rettet mot utvikling av frivilligheten og økt engasjement fra innbyggerne i lokalsamfunnet.

Frivillig Inderøy ønsket derfor å sette i gang et prosjekt hvor innbyggerne selv tok mer ansvar for å bidra til en positiv utvikling i den nye kommunen. Frivillig Inderøy søkte derfor Kommunaldepartementet om et 3-årig Bolystprosjekt i 2013. Bolystprosjektet "Inderøy - best i lag" fikk innvilget tilskudd fra Kommunaldepartementet sommeren 2013.

Forankring

Inderøy kommune har valgt «Best i lag» som sin visjon for den nye kommunen som ble dannet da Inderøy og Mosvik valgte å slå seg sammen 01.01.2012. Visjonen fremmer samarbeid som kommunens overordnede strategi for sitt arbeid. Bolyst-prosjektet «Inderøy – best i lag» er basert på visjonen om hva innbyggere kan få til ved å jobbe sammen til beste for Inderøy.

Frivillig Inderøys prosjekt «Inderøy – best i lag» gikk ikke inn i de tiltak allerede satt i gang innenfor «Inderøy 2020» men fokuserte på lokalt engasjement og frivillig innsats som drivkraft for å skape økt bolyst, felles identitet, økt engasjement og mer samarbeid.

Frivillig Inderøys bolystprosjekt «Inderøy – best i lag» ble støttet av kommunen. Dette skjedde både gjennom tilskudd fra kommunen til bolystprosjektet, men også ved at kommunens bidro med arbeidsinnsats i prosjektet.

Kommunen har vært en god samarbeidspartner for prosjektet. Kommunen har vært representert i prosjektets styringsgruppe ved næringssjef.

Mål for prosjektet

Hva var overordnede mål?

Prosjektet satte seg som mål å arbeide for:

- Et positivt og sterkt omdømme
- Økt stolthet, engasjement og felles identitet for innbyggerne
- Økt deltakelse i lokalsamfunnet
- Økt tilflytting
- Redusere fraflytting
- Nyetablering/tilflytting av bedrifter

Prosjektet «Inderøy – best i lag» hadde som mål å fremme bolyst, tilflytting og inkludering. Prosjektet baserer seg på lokalt engasjement og innsats fra frivillige som drivkraft for positiv utvikling.

Delmål:

- Fremme bolyst, felles identitet og lokal stolthet gjennom omdømmebygging
- Skape økt samhold og samarbeidsvilje, styrke deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet gjennom kompetanseheving, samarbeidsprosjekt og flere felles møteplasser. Prosjektet satte seg som mål å «gjøre det gode bedre»
- Hindre fraflytting og bidra til inkludering av nye innbyggere gjennom lokalt frivillig engasjement.

Resultat overordnede mål

Resultater for tiltak og delmål er i hovedsak realisert

Prosjektets hovedmål krever kontinuerlig arbeid fra hele lokalsamfunnet for å gi resultater. Her har Bolystprosjektets hovedoppgave vært å utfordre ulike lokale aktører til samarbeid, deltakelse og engasjement for felles utvikling av lokalsamfunnet. Dette mener vi at prosjektet har kommet langt med i løpet av prosjektperioden.

Omdømme:

Gjennom prosjektet har Frivillig Inderøy styrket Inderøys omdømme. Prosjektet har skapt positive medieomtale for Inderøy. Prosjektets hjemmesider har blitt trukket fram som et eksempel for andre kommuner. Spesielt blir arbeidet med omdømmebygging og kommunikasjon med innbyggerne, sett på med interesse fra andre frivilligsentraler og andre kommuner.

Prosjektet har skapt økt stolthet og engasjement. Flere innbyggere og frivillige organisasjoner bidrar til å synliggjøre Inderøy. De sprer positive nyheter og medieoppslag. Flere enn før hjelper hverandre med å spre informasjon om arrangement og aktiviteter.

Vi mener også at satsingen på omdømmebygging har hatt effekt for styrking av en felles identitet for innbyggerne. Samtidig har innbyggerne fra hver av grendene i Inderøy sin egen følelse av samhold og identitet.

Økt deltagelse i lokalsamfunnet:

Norsk Kulturindeks satte i 2016 Inderøy på en 32. plass når norske kommuner skulle rangeres etter kulturaktivitet. En av faktorene som ble beregnet inn, var frivillighet. Her var Inderøy nr 4 av alle kommuner i Norge, når det gjaldt frivillig deltagelse og aktivitet. Frivillig Inderøy registrerer økt aktivitet i lokale frivillige organisasjoner i løpet av de to siste årene.

Tilflytting og redusert fraflytting:

Inderøy har hatt en svak økning i antall innbyggere. Dette skyldes ikke bare tilflytting, men også at svært mange av de bosatte flyktingene i Inderøy trives og blir boende.

Fritidsaktiviteter, flyktningeguides, trygt og inkluderende oppvekstmiljø samt god mottagelse i nærmiljøet, trekkes fram som årsaker til at flyktningene blir boende. Vi mener derfor bolystprosjektets aktivitet har vært medvirkende til at flyktningene trives og blir boende.

Nyetablering/tilflytting av bedrifter:

Frivillig Inderøys bolystprosjekt har ikke vært rettet direkte mot næringsutvikling, men har jobbet med å skape et attraktivt lokalsamfunn, hvor også næringsaktører ønsker å etablere seg.

Bolystprosjektet har startet prosesser som kan bidra til utvikling av Straumen som bygdesentrum. Arbeidet med videreutvikling/profesjonalisering og markedsføring av store arrangement i Inderøy, har også bidratt til et positivt samarbeid mellom frivillighet og lokalt næringsliv.

Frivillig Inderøy har deltatt i arbeidsgruppa for etterbruk av Sakshaug skole. Her skisseres nå planer for en spennende samlokalisering mellom næringsaktører/ny-etablerere, frivillighet, aktører innen kunst/kultur-feltet og kommunale tjenesteområder. Samlokalisering kan bli gjennomført i løpet av 2017.

Målgrupper

Målgruppene for hovedprosjekter var sammensatt, men ble oppsummert som:

- Potensielle tilflyttere og besøkende
- Egne innbyggere

Innenfor målgruppa «Egne innbyggere» satset prosjektet spesielt på:

1. barn og unge
2. unge borteboere på hybel (Inderøy videregående skole)
3. Deltakere i introduksjonsprogrammet bosatt i kommunen
4. Innvandrere
5. Nye innbyggere

Resultat målgrupper:

Prosjektet har gjennomført tiltak rettet mot både potensielle tilflyttere og besøkende samt egne innbyggere. Når det gjelder egne innbyggere, er prosjektet godt fornøyd med hvordan bredden i tiltak har nådd de fleste av prosjektets målgrupper. Prosjektet har hatt utfordringer knyttet til gjennomføring av tiltak for to grupper; unge borteboere på hybel og nye innbyggere som er arbeidsinnvandrere.

Unge borteboere i Inderøy

Innen målgruppa "Egne innbyggere" har vi hatt utfordringer med å nå fram til unge borteboere på hybel (Inderøy videregående skole). Prosjektleder innså raskt at et samarbeid om tiltak for elever fra Inderøy videregående skole, var avhengig av et tett samarbeid med skolens ledelse.

Utfordringene med gjennomføring av tiltak for denne målgruppa var flere. Ledelsen ved skolen var svært opptatt av å avgrense skolen ansvar for elevene til skoletiden. Fritiden til elevene var ikke skolens ansvar. Ved gjennomføring av en del tiltak rettet mot borteboende elever på hybel, var vi avhengig av at invitasjoner til kurs og samlinger ble delt ut gjennom skolen. Dette fordi vi ikke hadde oversikt over hvem som var elever. Vi visste heller ikke hvilke elever som bodde på hybel i Inderøy.

Det var ikke enkelt å nå ut til elevene gjennom lokalavisen eller ved å henge opp plakater på skolene. Vi så at elevene ikke prioriterte deltagelse på slike kurs og informasjonskvelder, dersom de ikke var lagt opp i regi av skolen. Vi har derfor ikke greid å engasjere elever i videregående skole i den grad vi ønsket oss.

Inderøy videregående har de siste to årene fått et mer helhetlig fokus for elevenes trivsel og helse. Dette har ført til bedre samarbeid med skolen. Et eksempel er bedre samarbeidet om familiehelga VinterLeik. Frivillig Inderøy arrangerte også en Bolyst-dag for elevene i oktober 2015.

Arbeidsinnvandrere

En annen gruppe som det har vært utfordrende å nå fram til, er arbeidsinnvandrere bosatt i kommunen. Vi ønsket å sette i gang tiltak for bedre inkludering av arbeidsinnvandrere. Dette gjaldt spesielt de som har vært bosatt i kommunen over lengre tid og har fått familien sin til Inderøy.

Forsøk på å starte opp arbeidsgrupper med deltagere fra baltiske land og Polen, har dessverre ikke lyktes. Tilbakemeldingen fra våre kontaktpersoner i miljøet, viser at de ikke er kjent med frivillig arbeid eller organisasjonsarbeid. De ser med skepsis og litt mistanke på det offentlige og hjelpeapparatet i kommunen.

Erfaringene våre viser at det kan være enklere å engasjere deltagere fra målgruppa til konkrete arbeidsoppgaver eller aktiviteter (feks. Estisk matkveld). Det er enklere å forstå meningen med og gjennomføre for denne målgruppa, enn å delta i arbeidsgrupper med mer overordnet og uklare mål.

Rammer

Prosjektperiode

Tildelingen av bolystmidlene fra Kommunaldepartementet kom svært sent i juni 2013. Dette førte til at oppstart av prosjektet, med ansettelse av prosjektleder, ble gjennomført høsten 2016.

Prosjektleder startet i jobben fra 1.november 2013. Søknad om forskyvning av prosjektperioden fra november 2013 til november 2016 .

Prosjektet fikk i 2016 beskjed fra Kommunaldepartementet om forskjøvet frist for innlevering av sluttrapport til 1.desember 2016.

Prosjektet ble avsluttet 1.november 2016. Sluttrapport ble utformet i november måned og regnskapet oversendt til revisor for godkjenning.

Prosjekteier og styringsgruppe

Frivillig Inderøy SA er en frivilligsentral i Inderøy kommune.

Frivillig Inderøy er eier av bolystprosjektet, som støttes av Inderøy kommune. Frivillig Inderøy har drevet bolyst-prosjektet med en 100% stilling som prosjektleder. Drift av prosjektet har foregått i tillegg til sentralens daglige drift. Tiltakene i bolystprosjektet er gjennomført i tillegg til sentralens daglige drift.

Styret i Frivillig Inderøy har vært prosjektets styringsgruppe. Evaluering av prosjektet er gjennomført underveis av styringsgruppa i samarbeid med Inderøy kommune.

Delprosjekt og tiltak har blitt gjennomført av arbeidsgrupper/samarbeidsgrupper som har felles mål eller interesser for gjennomføring og utvikling av tiltakene.

Omfang og avgrensning

Arbeidsgrupper har jobbet intensivt og konkret med bestemte tiltak. I de ulike arbeidsgruppene, har vi lagt vekt på å engasjere og involvere deltakerne i de bestemte tiltakene gruppa har jobbet med.

Samtidig har vi gitt informasjon om bolystprosjektet og hvilke mål og delmål prosjektet har.

Medvirkning i planlegging/gjennomføring og mulighet til å sette i verk egne tiltak (innenfor de definerte mål), har vært viktig for å få lokalt eierskap og tilhørighet til bolystprosjektet.

Videreføring og overføringsverdi

Prosjektperioden har opprettet mange nye samarbeid. Bolystprosjektet har forankret tiltak og nye måter å samarbeide. Mange av tiltakene i Bolystprosjektet vil bli videreført etter prosjektperioden. Se mer om videreføring under beskrivelse av hvert enkelt tiltak i prosjektet.

Prosjektmodellen, med ulike samarbeidsgrupper for konkrete tiltak, er en praktisk og tiltaksrettet måte å skape nye samarbeid på, som lett kan overføres til andre kommuner.

Overføringsverdien vil være stor der det finnes frivilligsentraler eller frivilligkoordinatorer. Prosjektet er presentert for andre frivilligsentraler gjennom sentralenes nettverk og samlinger. Prosjektet har flere ganger gjennomført presentasjoner for nettverket til frivilligsentralene i Nord-Trøndelag.

Frivillig Inderøy har også delt erfaringer fra prosjektet med andre frivilligsentraler i Norge, gjennom interne forum for frivilligsentraler på internett.

Samarbeidet om omdømmebyggingen kan benyttes som en modell for andre kommuner. Her har Frivillig Inderøys arbeid med bildebank for Inderøy, omdømmebygging gjennom sosiale medier, samt hjemmesiden www.inderoy.no blitt trukket fram av andre kommuner, som spennende nye måter å jobbe med omdømmebygging i lokalsamfunn.

“Sluttrapport Bolystprosjekt detaljert” vil bli lagt ut på hjemmesiden www.inderoy.no/bolyst slik at erfaringer fra prosjektet kan brukes av alle interesserte.

Gjennomføring

Tre delprosjekt:

Prosjektet har tre prosjektområder/delprosjekt:

- Omdømmebygging Inderøy
- Å gjøre det gode bedre
- Inkludering og mangfold

DELPROSJEKT I: Omdømmebygging Inderøy

- synliggjøre Inderøy som bosted og som turmål (fotosamling, profilering gjennom hjemmesiden www.inderoy.no)
- Synliggjøre arrangement og aktiviteter
- Synliggjøre ildsjeler og Inderøy-ambassadører

Mål: Øke tilbakeflytting og tilflytting til Inderøy

Mål: Få flere innbyggere og besøkende (hytteeiere, turister) til å delta på arrangement og aktiviteter

Mål: Øke felles identitet og samholdet i lokalsamfunnet

Tiltak gjennomført delprosjekt I:

- www.inderoy.no er utviklet som en portal for alt som skjer i Inderøy. Design, logo og retningslinjer for profilering er helhetlig utviklet for både hjemmeside og sosiale medier.
- Fotosamling/bildebank med bilder fra Inderøy er samlet. Bildene er tatt av frivillige amatørfotografer. Bilder byttes ut på hjemmesiden etter årstidene. Disse bildene har vi fått mye positiv respons på. Vi ser at interessen for å ta bilder og dele dem med Frivillig Inderøy har økt i løpet av prosjektet.
- Rutiner utarbeidet og gjennomført for synliggjøring av positive omtaler/saker som gjelder Inderøy. Det er utviklet en kultur/vane for deling av positive saker på sosiale medier, blant inderøyninger. Det gir svært positive effekter for Inderøys omdømme.
- Markedsføringsplaner og posteplaner for en rekke faste arrangement og aktiviteter er utarbeidet av Frivillig Inderøy. Alle er gjennomført. Rutiner for forenkling av arbeidet med markedsføring gjennomgås og forbedres jevnlig.
- Det er jobbet grundig for å spre informasjon om aktiviteter og arrangement også til tilflyttere eller

besøkende. Arbeidet med felles profilering av flere arrangementshelger og sommer-aktiviteter, har utviklet samarbeidet mellom reiselivsaktører og Frivillig Inderøy. Bolystprosjektet har bidratt til et bedre samarbeid om felles profilering og synliggjøring av alt som skjer i Inderøy.

- Bolystprosjektet har vært en samarbeidspartner for Næringsforeningen og Den Gyldne Omvei i prosjektet «Bærekraftig Destinasjon». I arbeidet med sertifiseringen har Frivillig Inderøy bidratt med mye informasjon om lokale forhold. Vi har også formidlet kontakt mellom frivilligheten og prosjekteier. Inderøy ble sertifisert av Innovasjon Norge som «Bærekraftig Destinasjon» i 2016.
- Bolystprosjektet har jobbet med å hedre frivillige. Dette er gjort gjennom lokale medier, på sosiale medier og ved å nominere lokale frivillige til frivillighetspriser og kulturpriser.
- Egen julekalender på Youtube er laget, hvor frivillige fra Inderøy forteller hvorfor de er frivillige og hva frivillighet gir dem. Julekalenderen vil bli delt på sosiale medier i flere år.
- Bolystprosjektets arbeid har ført til to tv-innslag på NRK1 om frivillighet i Inderøy. Begge er produsert av FabelAktiv, i forbindelse med Extra-trekningene.
Tv-innslag er laget om:
 1. Inderøy Røde Kors Omsorg.
Tema: ekstrabesteforeldre for flyktningefamilier
 2. Innherred Kystlag, Kjerkesvågen Kai og båtforening og Jekta Paulines venneforening.
Tema: Jekta Pauline og det maritime frivillige miljøet på Kjerkesvågen.

Resultat delprosjekt I:

Gjennom prosjektet har Frivillig Inderøy jobbet mye med omdømmebygging. Vi har jobbet med å bygge stolthet og positivitet for bygda Inderøy. Stadig flere engasjerer seg for å bidra til å vise fram kulturlandskapet og kulturlivet i Inderøy.

Det har utviklet seg en kultur for å dele positive nyheter om Inderøy i sosiale medier. Det har blitt etablert grupper på Facebook hvor medlemmene deler "Inderøybilder".

Frivillig Inderøy drifter en portal for alt som skjer i Inderøy, gjennom hjemmesiden www.inderoy.no og den tilhørende Facebook-siden: <https://www.facebook.com/InderoyNo/>

Det har tatt tid og arbeid å få innbyggerne til å bruke siden og bidra til innhold på nettsiden. I løpet av prosjektperioden har besøkstallene for både nettsiden og Facebook-siden økt kraftig. En aktivitetskalender for alle åpne arrangement og møter er lagt inn på siden. Stadig flere bidrar med informasjon og materiell som de ønsker å få lagt inn på hjemmesiden og i aktivitetskalenderen.

Videreføring:

Omdømmebygging er et kontinuerlig arbeid som hele tiden må forbedres og utvikles for å ha effekt. Prosjektperioden har avdekket at det ikke er mulig å drive arbeidet kun gjennom frivillig innsats. Selv om det kan være mye frivillig innsats i arbeidet, må noen ha ansvaret for arbeidet og for utvikling av de tekniske løsningene.

For videreføring av dette arbeidet, har Frivillig Inderøy derfor søkt tilskudd fra Inderøy Kommune i 2017.

DELPROSJEKT II: Å gjøre det gode bedre

- Kompetanseheving i lag/foreninger
- Vertskapskurs for ledere og ildsjeler i frivilligheten
- Øke arrangementskompetansen og bidra til arrangementsutvikling
- Skape flere synlige arrangement for barnefamilier og ungdommer
- Videreutvikle Inderøy som turmål både sommer og vinter
- Skape flere samarbeidsprosjekt og møtepunkt mellom folk fra ulike grender.

Mål: styrket deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet

Mål: økt rekruttering til lokal frivillighet

Mål: Bedre ledelse av frivillige organisasjoner

Mål: Lønnsomme arrangement med utviklingspotensial

Mål: Sterkere felles identitet og samarbeidsvilje

Tiltak gjennomført delprosjekt II:

- **Kompetanseheving i lag/foreninger**

Bolystprosjektet har gjennomført en rekke kurs for Frivillig organisasjoner. Tema har blant annet vært: Markedsføring av arrangement eller aktiviteter, bruk av sosiale medier, prosjektledelse, styrearbeid og styrets rolle, kassererkurs, kurs i bruk av mCash, kurs i vertskapsrollen, rekruttering og inkludering.

Bolystprosjektet har delt beste praksis fra andre frivillige organisasjoner. Vi har hatt fokus på hvordan frivillige organisasjoner kan lage klare planer og arbeidsrutiner. Dette er viktig for å avklare forventninger, motivere og stille krav til sine medlemmer (for barneaktiviteter gjelder dette også foreldre/foresatte).

Gjennom Bolystprosjektet har Frivillig Inderøy også jobbet mye med kompetanseheving og bevisstgjøring når det gjelder inkludering av flyktninger/innvandrere i frivillige organisasjoner.

Prosjektleder har i tillegg fungert som veileder for frivillige organisasjoner som har bedt om råd i forbindelse med utvikling av nye aktiviteter og tiltak.

Videreføring:

Frivillig Inderøy mener kurs for frivillige organisasjoner har gitt gode resultater. Vi viderefører arbeidet i sentralens daglige drift. Vi vil også jobbe videre med å dele presentasjoner og kursmaterieell med frivillige organisasjoner på våre nettsider.

- **Arrangementsutvikling**

Bolystprosjektet har jobbet mye med utvikling av arrangement i Inderøy. Dette er gjort både gjennom kompetanseheving av frivillige, men også ved samarbeid med frivillige arrangører om konkrete tiltak for videreutvikling av deres arrangement.

Resultat:

Arbeidet har gitt resultater i forbindelse med Verdensdagen for fysisk aktivitet, Musikk i Parken (sommerkonserter i Muustrøparken) og Straumens Dag. Bolystprosjektet har bidratt i utviklingsarbeid for Kvennavikdagan og Inderøy

Husflidslags Husflidsmesse. Prosjektet har også bistått festivalene Soddjazz og InderøyFest, samt arrangement i regi av Den Gyldne Omvei.

Etter tilbakemelding fra arrangører i Inderøy om manglende lokal profilering av arrangement (før og under arrangementene) tok Frivillig Inderøy initiativ til et profileringsprosjekt for Inderøy. Inderøy Kommune tok ansvaret for dette prosjektet. Prosjektet har i 2016 utviklet en ny designprofil kalt «Inderøy – best i lag».

Videreføring:

Prosjektet videreføres av Inderøy Kommune i 2017. Det arbeides videre med arbeidsrutiner for disponering og bruk av profileringsflatene.

- **Familiehelga VinterFest/VinterLeik**

Frivillig Inderøy har utviklet et samarbeid med lokale aktører om en festival/familiehelg for barn og unge. Familiehelga har vi gitt navnet «VinterLeik».

Resultat:

Familiehelga har hatt stor utvikling i løpet av prosjektperioden. «VinterLeik» har involvert et bredt lokalt samarbeid med blant andre Kirka i Inderøy, Sund folkehøgskole, Inderøy ungdomsskole, Inderøy videregående skole, barnehagene i Inderøy, e@internettkafe samt frivillige organisasjoner.

«VinterLeik» har også fått til et samarbeid med LO i Inderøy/Leksvik, Tekna, Kodeklubben samt lokale og regionale næringsaktører. Dette samarbeidet ønsker Frivillig Inderøy å utvikle videre.

Familiehelga «VinterLeik» har utviklet seg mye gjennom prosjektperioden. Fra å ha fokus på å underholde barn og unge som publikum, er vi nå mer opptatt av arrangere ei familiehelg hvor barn og unge selv er aktive deltagere.

Videreføring:

Samarbeidet om familiehelga VinterLeik vil bli videreført i 2017. Fokus vil være møteplasser for familier og arrangement/aktivitet der barn og unge selv kan delta.

- **Bolystdag for elever ved Inderøy videregående skole.**

Bolystprosjektet har, som nevnt under målgrupper, hatt utfordringer med å nå ut til målgruppa borteboere på hybel i Inderøy.

I oktober 2015 fikk Bolystprosjektet overta Inderøy videregående skole en hel skoledag. Isteden for vanlig undervisning, fikk elevene delta på en rekke workshops arrangert av Frivillig Inderøy. Vi utfordret også elevene til å bidra med innspill til hvordan Inderøy kan bli et enda bedre sted å bo.

Resultat:

Vi lærte mye om kurs og workshops for ungdom i Inderøy videregående av denne Bolystdagen. Det kom noen gode innspill fra elevene til bolystprosjektet. En annen effekt av denne Bolyst-dagen, var et bedre samarbeid med ledelsen ved Inderøy videregående skole. Dette har allerede ført til flere planer om samarbeid i 2017.

- **Samarbeide med lag/foreninger og turgrupper om profilering og videreutvikling av turmål i Inderøy**

Bolystprosjektet har samarbeidet med en rekke sti-eiere, frivillige sti-entusiaster, vellag og grendelag om utvikling av turmål og turarrangement i Inderøy.

Oppgaver gjennomført:

- ✓ Utvikling av nettsider for flere av stiene
- ✓ Bistand ved søknader av tilskudd til skilting og merking
- ✓ Innsamling av bilder til en bildebank for turstier i Inderøy
- ✓ Videreutvikling av arrangementsturer under InderøyTur
- ✓ Bistand til InderøyTur-komiteen i forbindelse med markedsføring og synliggjøring av turstiene.
- ✓ Temakveld om utvikling av turstier og profilering
- ✓ Kurs i bruk av geocaching
- ✓ Markedsføring og utvikling av arrangement i forbindelse

med "Friluftlivets År 2015" i Inderøy.

Resultat:

- ✓ Antallet registrerte brukere av turstier har økt kraftig
- ✓ Antallet barn som har gjennomført turer i Inderøy har økt kraftig.
- ✓ InderøyTur-stiene har blitt enda bedre kjent for besøkende i Inderøy.
- ✓ Arbeidet med InderøyTurer trekkes fram av ordfører som en viktig del av Inderøys satsing på folkehelse.

Bolystprosjektet har vært en støttespiller og bidragsyter til utviklingen, men prosjektet alene kan ikke ta æren for de gode resultatene. Dette er resultat av godt og langsiktig arbeid med utvikling av turstier, både fra frivillige og fra ansatte i Inderøy kommune.

• **Deltagelse og engasjement - grendeutvikling**

I løpet av prosjektperioden, så vi at det var et behov for å gjennomføre tiltak for å øke det frivillige engasjementet for grendeutvikling.

Resultat:

I grenda Sandvollan ble det gjennomført fellesmøte med frivillige organisasjoner. Tema var felles utfordringer og bruk av lokaler. Frivillig Inderøy deltok også i arbeidsgruppa som organiserte åpningen av ny kunstgressbane. Det ble i tillegg gjennomført en samling for frivillige som hadde arbeidet med kunstgressbanen.

Grendene Utøy og Lyngstad ble utfordret av prosjektleder til å se på hvilke tiltak de ønsket gjennomført for sin grend. Her overskygget den pågående utredningen om skolestruktur arbeidet med annen grendeutvikling. Det ble derfor ikke igangsatt andre tiltak i samarbeid med Frivillig Inderøy.

Videreføring:

Flere grendelag i Inderøy har gitt tilbakemelding på at de ønsker videre samarbeid med Frivillig Inderøy om grendeutvikling og inkludering av tilflyttere i 2017.

Inderøy Kommunes tiltak i 2017 for økt tilflytting og bolyst til grendene er fortsatt uavklart. Frivillig Inderøy vil stille seg positiv til å delta i ei arbeidsgruppe for grendeutvikling og inkludering, sammen med grendelag og Inderøy kommune.

- **Deltagelse og engasjement - sentrumsutvikling**

I løpet av prosjektperioden, så vi at det var et behov for å øke det frivillige engasjementet for utvikling av Straumen sentrum.

I kommunesenteret Straumen, var det behov for å samle engasjerte ildsjeler, frivillige og næringsaktører og utvikle nye tiltak for mer folkeliv og aktivitet i Straumen sentrum.

Dette behovet oppstod i løpet av prosjektperioden, da flytting av en matvarebutikk, førte til store endringer for hvordan området ble brukt av innbyggerne. Redusert aktivitet og mindre bruk av området, hadde også betydning for besøkende til Straumen sentrum.

Resultat:

Frivillig Inderøys bolystprosjekt gjennomførte felles vandring og idemyldring med bygartner i Steinkjer; Finn Rossing. Dette ga mange gode ideer til videreutvikling av området som et uterom og som arena for aktivitet. Det ble også rekruttert flere interesserte frivillige som ønsket å bidra i arbeidet videre.

Frivillig Inderøy, i samarbeid med andre aktører innen kunst og kultur i Inderøy, fremmet ideer for hvordan en akse i området kan brukes til utplassering av interaktive installasjoner og kunst. Det er utformet et forslag til et utsmykningsprosjekt for Straumen, som er lagt fram for Inderøy kommune.

Frivillig Inderøy gjennomførte et kunst-stunt med gatekunst på Straumens Dag 2016. Dette ble gjort for å gi besøkende og innbyggere ny inspirasjon til videre utvikling av området som arena for kunst og aktivitet.

Både Frivillig Inderøy og Inderøy kommune har mottatt flere innspill og ideer fra innbyggere vedrørende framtidig utvikling og bruk av området "Kølhagan" i

Straumen sentrum. På bakgrunn av dette, har Frivillig Inderøy engasjert seg for et forprosjekt kalt "Amfi i Kølhagan".

Videreføring:

Utsmykningsprosjekt for Straumen er vedtatt av Inderøy kommune. Prosjektet vil bli videreført av Inderøy kommune.

Forprosjektet "Amfi i Kølhagan" er positivt mottatt av Inderøy kommune. Frivillig Inderøy vil videreføre arbeidet med "Amfi i Kølhagan" i starten av 2017.

Dersom planene for et amfi i Kølhagan mottas positivt av deltagere på høringsmøter, vil Frivillig Inderøy fremme et forslag om at hovedprosjektet eies og igangsettes av Inderøy Kommune.

- **Fellesmøter for frivillige organisasjoner:**

Bolystprosjektet har gjennom prosjektperioden invitert til flere fellesmøter for frivillige organisasjoner som arbeider mot de samme målgruppene.

Dette gjelder blant annet:

1. fellesmøter om aktivitet for eldre i institusjoner/omsorgsboliger
2. fellesmøte om integrering av flyktninger
3. fellesmøter for pensjonistlag
4. fellesmøter for kor
5. fellesmøter for teaterlag vedr. vandreteater på Straumen
6. fellesmøter for sti-eiere
7. fellesmøter for grendelag og velforeninger

Selv om det kan være utfordrende å få travelt opptatte frivillige ledere til å prioritere fellesmøter, har vi hatt gode tilbakemeldinger fra de som har deltatt. Flere har funnet nye samarbeidspartnere gjennom disse møtene.

Resultat:

- Nye samarbeid om aktivitet for eldre
- Nye samarbeid og tettere kontakt mellom Frivillig Inderøy og

frivillige organisasjoner om aktiviteter for integrering av flyktninger

- Flere felles arrangement for pensjonister i regi av pensjonistlagene. Faste sommer-arrangement og større arrangement hvor pensjonistlagene drar sammen. Felles invitasjoner til turer for pensjonister.
- Mer samarbeid mellom korene i Inderøy. Flere samarbeidsprosjekt er gjennomført. Som et direkte resultat av et fellesmøte for kor, vil Inderøy være arena for en trøndersk korfestival 10.juni 2017.
- Flere sti-eiere har fått delt beste praksis og har fått tips og råd fra hverandre til videreutvikling av stier. Bolystprosjektet har bidratt til økt kunnskap om ordninger for skilting og merking.
- Fellesmøter for grendelag og velforeninger har ikke vært like vellykket som andre tiltak i delprosjektet. Årsaken til dette har vært en pågående prosess med vurdering av ny skolestruktur i Inderøy. Mange av grendelagene har derfor hatt fokus på bevaring av grendeskolene. Dette har dempet fokuset på andre tiltak for utvikling av grendesamfunnene i Inderøy.

Videreføring:

Frivillig Inderøy mener tilbakemeldingene og resultatene fra fellesmøtene er så gode, at vi ønsker å videreføre dette som en del av sentralens daglige drift i 2017. Ledelse av disse møtene kan gjøres av frivillige med erfaring fra møteledelse. Dette bør gjøres av frivillige som ikke er medlem i noen av organisasjonene.

- **Arrangere ei årlig «Best i lag»-uke med fokus på bolyst, inkludering, mangfold og deltakelse i lokalmiljøet.**

Etter å ha invitert ulike frivillige organisasjoner i Inderøy til ei «best i lag» - uke, fikk vi tilbakemelding på at de frivillige organisasjonene lokalt. De fleste ønsket å prioritere deltagelse ved de arrangementshelgene vi allerede har i Inderøy, istedenfor å utvikle enda et arrangement. Bolystprosjektet har derfor jobbet for å involvere flest mulig i de større arrangementene/festivalene som allerede finnes.

DELPROSJEKT III: Inkludering og mangfold

- Inkludering av innvandrere og andre innflyttere i aktiviteter og frivillige lag/foreninger
- Flyktningeguides/kontaktpersoner i lokalbefolkningen, bygge nettverk
- Kurs og temasamlinger for innvandrere/ungdommer som skal ta yrkesvalg. Presentere ulike yrker, bidra til større forståelse for hvilke arbeidsoppgaver de ulike yrkene utfører
- Mentorprosjekt for ungdom og innvandrere i yrkesopplæring
- Sommerjobbprosjekt for innvandrere i samarbeid med flyktnings-tjenesten. NAV og næringslivet
- Inkludering av innbyggere med begrenset sosialt nettverk i aktiviteter

Mål: Hindre fraflytting – bidra til at innvandrere fortsatt vil bo i Inderøy etter endt Introduksjonsprogram

Mål: Bidra til et tolerant og mangfoldig lokalsamfunn

Mål: Styrke innvandrere og innflytteres muligheter for å skaffe seg et sosialt nettverk

Mål: Styrke innvandrere og ungdommers muligheter i arbeidsmarkedet.

Tiltak gjennomført delprosjekt III:

- **Foredrag for innvandrere om frivillighet**

Frivillig Inderøy har gjennom bolystprosjektet hatt foredrag for flyktninger i introduksjonsprogrammet om frivillighet. Bolystprosjektet har også formidlet informasjon om ulike aktiviteter de kan delta på i Inderøy.

Resultat:

Flyktninger i Inderøy har fått kunnskap om hvorfor deltagelse i frivillig aktivitet er viktig og hva det kan gi dem. Deltagerne i introduksjonsprogrammet har vært svært positive til å delta som frivillige i forbindelse med festivaler og arrangement.

Mange av flyktingene deltar på fritidsaktiviteter. Gode eksempler er bowling, fotball eller volleyball. Det er godt oppmøte på Språktreningen arrangert av Inderøy Røde Kors Omsorg.

Flere av de bosatte flyktingene har vært aktive for å arrangere en internasjonal fest. De er også flinke til å gi tilbakemeldinger på aktiviteter og tiltak de savner.

- **Individuell veiledning og informasjon til innflyttere om fritidstilbud.**

Frivillig Inderøy har i prosjektperioden gitt informasjon om fritidstilbud til enkeltpersoner som er innflyttere i Inderøy. Det har vært utfordrende å få oversikt over hvem som er innflyttere i Inderøy.

Det har ikke lyktes oss å få et fast samarbeid med velforeninger og grendelag om informasjon til innflyttere. Dette skyldes blant annet at grendelagenes fokus i prosjektperioden har vært rettet mot kommunens utredning av ny skolestruktur i Inderøy.

Resultat:

Siden vi har hatt problemer med å få kontakt med innflyttere i Inderøy direkte, har vi isteden jobbet for å gjøre hjemmesiden og sosiale medier knyttet til Inderøy.no godt

kjent. Det har vært et mål å gjøre hjemmesiden og sosiale medier knyttet til profilen Inderøy.no godt kjent for alle i befolkningen, også tilflyttere.

For å nå målet, har vi levert ferdigskrevne omtaler og pressemeldinger til lokalavisen og regionavisen. Hjemmesiden og Facebook-siden blir også nevnt i omtaler av andre arrangement i regi av Frivillig Inderøy.

I tillegg til medieoppslag, har vi hatt betalte kampanjer på sosiale medier. Vi jobber også for at all informasjon om aktivitet eller arrangement som deles, skal være tilpasset innflyttere eller besøkende. Det er likevel vanskelig å måle hvorvidt dette når direkte ut til innflyttere i Inderøy.

Videreføring:

Saken om skolestruktur i Inderøy er nå avgjort politisk, med bevaring av dagens skolestruktur som resultat.

Samtidig er skolene sårbare for nye vurderinger i framtida, dersom det ikke arbeides aktivt for å bevare og helst øke elevantallet ved skolene. Dette gir behov for et bredt samarbeid mellom frivillige i grendelag og andre frivillige lag i grendene, næringsliv og kommune. Dersom Inderøy skal øke tilflyttingen til grendene, må det samarbeides om målrettede tiltak for tilflytting.

Flere grendelag i Inderøy har gitt tilbakemelding på at de ønsker videre samarbeid om grendeutvikling i 2017.

Inderøy Kommunes tiltak i 2017 for økt tilflytting og bolyst til grendene er fortsatt uavklart. Frivillig Inderøy vil stille seg positiv til å delta i ei arbeidsgruppe for grendeutvikling og inkludering, sammen med grendelag og Inderøy kommune.

- **Samarbeid med Røde Kors om rekruttering av flyktningeguides**

I prosjektperioden har Frivillig Inderøy samarbeidet tett med flyktningsgjengen og Røde Kors. Målet har vært å avdekke flyktningsgjengens ønsker og behov for flyktningeguides.

Ved å avdekke ønsker og behov kan vi gjøre bedre arbeid med rekruttering av nye flyktningeguides. Frivillig Inderøy har bistått Inderøy Røde Kors med rekruttering av nye flyktningeguides. Noen av guidene har fungert som ekstrabesteforeldre for bosatte familier med barn.

Resultat:

Inderøy Røde Kors har mange flyktningeguides. Ordningen har et godt omdømme lokalt. Ordningen med flyktningeguides som ekstrabesteforeldre har fungert svært godt.

Inderøy Røde Kors sine ekstrabesteforeldre har skapt medieoppslag og tv-innslag på NRK1. Inderøy Røde Kors sine ekstrabesteforeldre trekkes i flere sammenhenger frem som et godt eksempel på en ny type flyktningeguide.

Videreføring:

Inderøy Røde Kors har mange flyktningeguides, men trenger trenger stadig flere etterhvert som nye flyktninger bosettes.

Frivillig Inderøy har fått et godt samarbeid med ny, frivillig flyktningeguide-koordinator i Inderøy. Hun jobber målrettet og aktivt for å skaffe nye guides.

Flyktningeguide-koordinator etterlyser rutiner for å dele informasjon om hvilke fritidstilbud som finnes. Det etterlyses også en fast felles møteplass for alle som jobber med frivillige aktiviteter for flyktninger.

Frivillig Inderøy vil i 2017 samarbeide med flyktningeguide-koordinator og andre frivillige i Inderøy Røde Kors, for å samle informasjon om alle fritidstilbud. Dette gjøres som en del av sentralens daglige drift. Vi vil også invitere til felles samlinger for alle i Inderøy som arbeider med integrering gjennom fritidsaktiviteter.

Samtidig har vi startet arbeidet med å rekruttere flere frivillige som kan ta ansvar for å gi flyktningene informasjon om familieaktiviteter (lavterskel aktivitetstilbud til barn og barnefamilier). Målet med dette er økt deltagelse i familieaktiviteter fra bosatte barnefamilier, uten at dette krever mye oppfølging fra Frivillig Inderøy.

- **Informasjon om yrkesliv/arbeidsliv for innvandrere**

Bolystprosjektet har hatt som mål å gi innvandrere større forståelse for hva ulike yrker går ut på.

Målgruppa var opprinnelig alle innvandrere i Inderøy. Det har vært utfordrende å få kontakt med arbeidsinnvandrere bosatt i kommune. Tiltaket har derfor blitt rettet mot bosatte flyktninger i Inderøy. Samarbeidet med flyktningetjenesten og voksenopplæringen i Inderøy kommune har vært svært godt.

Det har vært viktig for bolystprosjektet å bidra til at målgruppa skal få konkret og enkel informasjon om hvilke oppgaver som utføres i forskjellige yrker.

Gjennom bolystprosjektet har Frivillig Inderøy også jobbet for å gi målgruppa innsikt i hva som kreves av utdanning og kompetanse, for å få jobb innenfor ulike yrker.

Tiltak gjennomført:

- ✓ Presentasjon av ulike yrker i samarbeid med arbeidstaker-organisasjoner
- ✓ Sommerarbeid for flyktninger i Inderøy Kommune og hos lokale bedrifter
- ✓ Rollespill for jobbsøkere
- ✓ Internasjonal Kafe på Straumens Dag 2014
Planlegging, organisering og gjennomføring sammen med deltakerne
- ✓ Gjenbruksmarked på Straumens Dag 2016
Planlegging, organisering og gjennomføring sammen med deltakerne
- ✓ Yrkesdager høsten 2016
Samarbeid mellom Frivillig Inderøys bolystprosjekt og flyktningetjenesten i Inderøy Kommune. To dager med yrkesinformasjon og bedriftsbesøk høsten 2016
- ✓ Foredrag fra næringsaktører om forventninger og krav til deres ansatte

Resultat:

I arbeidet med å bidra til flyktningers integrering, har Bolystprosjektet arbeidet med å styrke flyktningers kunnskap og forståelse for norsk arbeidsliv. Prosjektet har utviklet Frivillig Inderøys kompetanse. Arbeidet har gitt oss nye erfaringer med hvordan opplæringen best kan gjennomføres for å engasjere målgruppa og gi best mulig effekt.

Tilbakemeldingene fra både flyktningetjenesten, voksenopplæringen og andre samarbeidspartnere for tiltaket har vært ubetinget positiv.

Tilbakemeldingene fra flyktninger som har deltatt, er at tiltaket har vært svært nyttig. Dette er et tiltak de ønsker videreført.

Inderøy Kommunes enhet for kommunalteknikk har hatt svært positive erfaringer med "Sommerjobb for flyktninger".

Frivillig Inderøy har vært nødt til å utvikle mye nytt materiell selv for gjennomføring av dette tiltaket. Mye av det materialet som allerede finnes, er rettet mot prosjektledere, ansatte i flyktningetjenesten/ voksenopplæringen eller frivillige som skal arbeide med integrering. Lite er utviklet for å brukes direkte rettet mot innvandrere. Det finnes få program innen temaet, som har ferdig utviklet materiale for opplæring av innvandrere.

Tiltakene i bolystprosjektet er nå testet ut, materiale for opplæring er samlet inn og kan videreutvikles.

Videreføring:

Å gi flyktninger bedre kunnskap og erfaring med norsk arbeidsliv, er utenfor frivilligsentralens vanlige drift.

Videreføring av deler av tiltaket kan gjennomføres av Inderøy Kommune.

Informasjonsmøter og foredrag kan gjennomføres gjennom et samarbeid med arbeidstaker-organisasjoner i kommunen.

Frivillig Inderøy har bedt kommunen se nærmere på muligheten for et sommerjobbprosjekt for bosatte flyktninger i Inderøy.

Dersom frivilligsentralen skulle videreføre tiltaket eller deler av det, er sentralen avhengig av ekstern finansiering.

- **Mentor-prosjekt for innvandrere og ungdom i yrkesfag**

Bolystprosjektet til Frivillig Inderøy hadde mentorprosjekt som ett av flere tiltak i delprosjekt III. Vi startet opp et samarbeid med flyktningetjenesten i Inderøy kommune, for å avdekke behov for mentorer. Målgruppa var bosatte flyktninger som hadde fullført eller snart var ferdige med Introduksjonsprogrammet.

Prosjektet ble også markedsført mot ungdom i yrkesfag. Det var liten respons fra ungdom i yrkesfag. Fokuset ble derfor rettet mot bosatte flyktninger i Inderøy.

Etter Frivillig Inderøys oppstartsmøte med flyktningetjenesten for mentor-prosjektet, tok Senter for Kunnskap og Likestilling (KUN) kontakt med Inderøy Kommune. De ønsket å samarbeide med kommunen om et lignende mentorprosjekt. Dette mentorprosjektet ville bli gjennomført i flere kommuner i Nord-Trøndelag.

Dette stilte kommunen seg positiv til. Det ble derfor avtalt med Inderøy kommune at prosjektleder for bolystprosjektet hos Frivillig Inderøy, skulle delta i arbeidsgruppa for KUNs mentor-prosjekt i Inderøy. KUN overtok ansvaret for ledelse av mentor-prosjektet.

Resultat:

Planer for rekruttering av frivillige i KUNs mentor-prosjekt, fokuserte på markedsføring av prosjektet i media og oppslag i butikker.

Rekrutteringer av mentorer i hht KUNs planer ble forsøkt, men ingen frivillige meldte sin interesse.

KUNs Mentor-prosjekt i Inderøy ble derfor ikke gjennomført i hht. KUNs prosjektplan.

KUNs plan for rekruttering samsvarte ikke med de erfaringer Frivillig Inderøy har gjort seg når et gjelder rekruttering til

lignende prosjekt. Vi ser behovet for personlig kontakt ved rekruttering. Vi ønsket oss også et tett samarbeid med arbeidstaker-organisasjonene i Inderøy.

Videreføring:

KUN har ikke kontaktet Frivillig Inderøy vedrørende flere forsøk på gjennomføring av deres mentorprosjekt.

En gjennomføring av Frivillig Inderøys opprinnelige mentorprosjekt, vil være avhengig av ekstern finansiering.

- **Referanser og attester til faste frivillige som bidrar over lengre tid**

Bolystprosjektet har utviklet en ordning hvor frivilligsentralen kan stå som referanse for frivillige. Dette gjelder spesielt for de som bidrar med frivillig innsats over lengre tid.

Frivillig Inderøy har laget seg maler for slike attester og utviklet et design for attestene. Det er satt kriterier for hvem som kan få attest fra Frivillig Inderøy og hvor beskrivende attestene skal være.

Resultat:

Frivillig Inderøy har hatt liten respons fra frivillige som ønsker slike attester. Tiltaket kan gjøres enda bedre kjent, spesielt blant ungdom som kan tenke seg å bidra som frivillige.

Videreføring:

Frivillig Inderøy deler nå maler for attester med de frivillige organisasjoner i Inderøy som ønsker å bruke dem. Vi vil jobbe videre for å gjøre tilbudet mer kjent.

- **Inkludering i fritidsaktiviteter**

Frivillig Inderøy ønsket et samarbeid med hjelpeapparatet i kommunen og NAV lokalt. Målet var å bedre kunne inkludere mennesker med begrenset sosialt nettverk i de lokale fritidstilbudene og i frivillige organisasjoner.

Det ble gjennomført møter med NAV Inderøy og Psykososialt Team i kommunen, med tema inkludering i fritidsaktiviteter.

Resultat:

For at tiltaket skulle lykkes var vi avhengig av et godt samarbeid med hjelpeapparatet i kommunen og NAV Inderøy. Selv om begge parter var svært positive til å bidra med kunnskap og erfaringer, var tjenestene ikke organisert slikt at ansatte i kommunens hjelpeapparat kunne følge brukere inn i en fritidsaktivitet ved oppstart. Dette så vi på som avgjørende for å lykkes med inkludering i eksisterende fritidsaktiviteter.

Selv om hjelpeapparatet gir ut kontaktinformasjon og oppfordrer deres brukere til å oppsøke frivilligsentralen, vil det være få som tar initiativ til å følge opp dette selv. De er avhengige av motivering, hjelp og støtte fra noen de kjenner.

Hjelpeapparatet i kommunen etterspurte isteden skreddersydde aktivitetstilbud for enkelte brukere. Dette hadde bolystprosjektet dessverre ikke ressurser til å organisere.

Samtidig ser vi at oppstarten av tiltaket har gjort frivilligsentralens arbeid bedre kjent blant ansatte i kommunen. Vi får derfor flere henvendelser om hjelp til brukere nå, enn før bolystprosjektet startet.

Videreføring:

Frivillig Inderøy er positiv til en videreføring av arbeidet med inkludering i fritidsaktiviteter i sentralens vanlige drift. Det forutsettes at hjelpeapparatet i Inderøy kommune får anledning til å bruke ressurser slik at de kan følge brukere inn i fritidsaktiviteter.

- **Bolyst i grendene - inkludering**

Som nevnt under gjennomføring av tiltak i Delprosjekt II: "Fellesmøter for frivillige organisasjoner" har samarbeid med grendelag i Inderøy ikke vært like vellykket som mange andre tiltak.

Årsaken til dette har vært en pågående prosess med vurdering av ny skolestruktur i Inderøy. Mange av grendelagene har derfor hatt

fokus på bevaring av grendeskolene. Dette har dempet fokuset på andre tiltak for utvikling av grendesamfunnene i Inderøy. Dette har også hatt betydning for utviklingen av inkluderingstiltak for tilflyttere til grendene.

Resultat:

Det er gjennomført flere møter med grendelag i løpet av prosjektperioden . Her har inkludering av nye innflyttere til grendene og markedsføring av grendas aktivitet vært tema.

Vi har dessverre ikke lyktes i å få til et samarbeid om utforming av brosjyrer og rutiner for å ønske velkommen til grenda.

Tilbakemeldinger fra noen av grendelagene, har vært et ønske om mer fokus på nettsider enn trykte brosjyrer. Dette gjelder spesielt for de grendene som mangler egne nettsider.

Videreføring:

Flere grendelag i Inderøy har gitt tilbakemelding på at de ønsker videre samarbeid med Frivillig Inderøy om grendeutvikling og inkludering av tilflyttere i 2017.

Inderøy Kommunes tiltak i 2017 for økt tilflytting og bolyst til grendene er fortsatt uavklart. Frivillig Inderøy vil stille seg positiv til å delta i ei arbeidsgruppe for grendeutvikling og inkludering, sammen med grendelag og Inderøy kommune.

- **Faddere i frivillige aktiviteter**

Frivillig Inderøy har jobbet med å få oversikt over kontaktpersoner i lagene. Der innvandrere/innflyttere har ønsket seg aktivitet, har vi også jobbet med forventningsavklaring og bevisstgjøring av frivillige ledere.

Resultat:

Tilbakemelding fra de fleste ledere som har fått henvendelser fra Frivillig Inderøy om inkludering av nye medlemmer, har vært positiv. Dette er et kontinuerlig forankringsarbeid i frivillige organisasjoner, da frivillige ledere stadig byttes ut med nye.

Videreføring:

Gjennom arbeidet med inkludering gjennom fritidsaktiviteter i Bolystprosjektet, har Frivillig Inderøy fått økt kompetanse innen arbeidsområdet. Frivillig Inderøy har fått ny kunnskap om hva som kreves av frivillige ledere når noen ny skal bli med i organisasjonen.

På bakgrunn av de gode resultatene arbeidet i bolystprosjektet har vist, vil Frivillig Inderøy videreføre dette arbeidet i daglig drift av sentralen i 2017. Arbeidet med rekruttering av faddere, kan også gjøres av en frivillig som får opplæring fra Frivillig Inderøy.

ERFARINGER FRA PROSJEKTET

Prosjektet har gitt Frivillig Inderøy økt kunnskap om lokalt utviklingsarbeid. Prosjektet har endret måten frivilligsentralen jobber med utvikling av lokalsamfunnet - sammen med frivilligheten.

Prosjektet har også videreutviklet og styrket samarbeidet med andre parter innen næringsliv, reiseliv, kirken i Inderøy, Inderøy videregående, Sund folkehøgskole, Vekstbedriften Flyndra mfl.

Samarbeidet mellom Bolystprosjektet og kommunen har vært positivt. Prosjektet har gitt et tettere samarbeid. Bolystprosjektet har også utviklet samarbeid innen flere tjenesteområder enn tidligere.

Prosjektet har hatt som mål å gi innbyggere og frivillige organisasjoner mer kunnskap og større engasjement for lokalt utviklingsarbeid. Dette er en prosess som bolystprosjektet har startet opp. Arbeidet har allerede gitt resultater. Vi forventer å se resultater av dette arbeidet også etter at bolystprosjektet er avsluttet.

ØKONOMI

Regnskapet for bolystprosjektet er ført av Klepp Regnskap AS. Regnskapet er revidert av Ernst & Young Steinkjer, ved Tore Eggen.

Endring regnskap fra budsjett

Prosjektet utviklet etter hvert gode metoder for å løse oppgaver selv innen markedsføring av arrangement og tiltak. Vi så mer effektive resultater ved å leie inn hjelp til disse oppgavene i en prosentstilling med konkrete arbeidsoppgaver innen markedsføring, design og utvikling av nettsider. Alternativet ville vært å leie inn it-konsulenter samt bruke et reklamebyrå/designbyrå til oppgavene. Dette er årsaken til at kostnader er flyttet fra «Markedsføring av arrangement/tiltak» til lønnskostnader i prosjektet.

Arbeidsinnsats fra Inderøy Kommune, har involvert både ansatte innen miljø/friluftsliv (sti-utvikling), kulturenheten i Inderøy kommune (arrangementsutvikling, kompetanse-heving frivillige org), Inderøy ungdomsskole (Bolystdag 2016 under VinterLeik) og flyktningetjenesten.

Næringssjef har vært en aktiv samarbeidspartner i prosjektet, gjennom både prosjekt Profileringsflater Inderøy, Utsmykningsprosjekt for Straumen sentrum, VinterLeik, etterbruk av Sakshaug skole og arrangementsutvikling. I tillegg har næringssjef deltatt i styringsgruppa for bolystprosjektet. Vi kan derfor beregne at kommunens arbeidsinnsats i prosjektet er minst i henhold til anslått verdi i søknad fra 2013 om tilskudd til prosjektet.

Egeninnsats og kostnader frivillighet:

Bolystprosjektet har samarbeidet både med formell og uformell frivillighet i Inderøy. Frivillige har bidratt både med arbeidsinnsats og dekning av kostnader (for eksempel kostnader til foredragsholdere, kursledere, leie av lokaler, innkjøp utstyr, servering på arrangement mm.)

Frivillige har vært involvert i gjennomføring av tiltakene i prosjektet. De ulike tiltakene har involvert et stort antall personer i løpet av prosjektperioden. Arbeidsinnsats fra frivillige i prosjektet er derfor betydelig og helt nødvendig for gjennomføringen.

Frivillig organisasjoner og frivillige ildsjelers arbeidsinnsats samt dekning av kostnader til tiltak, er høyere enn anslått verdi i søknad fra 2013.

Vi har likevel valgt å ikke heve verdien av kostnader for lag/foreninger mye i «Finansieringsplan_resultat_Bolystprosjekt2013_2016».

Frivillig Inderøys egeninnsats i prosjektet er høyere enn budsjettet.

Totalt har prosjektet høyere lokal finansiering enn budsjettet.

Vedlegg:

Resultatregnskap

Finansieringsplan med resultat

Oversikt Bolyst regnskapstall 2013 - 2016 mot budsjett

Revisjonsrapport fra Ernst & Young
